

관리번호	4-6	태백시 첫생명맞이&아이키움센터 건립 [산모케어센터 신설]
------	-----	--

사업구분	신규	예산구분	예산	완료시기	2024년
공약구분	임기내	추진진도	정상추진	진도율	35%

비전과 전략

- 누구나 가고싶고 살고싶은 청정고원 힐링도시 태백
- 정주여건 개선을 위한 지역포괄케어 인프라 조성

□ 사업개요

- 태백 첫생명맞이&아이키움센터 건립
 - 사업기간: 2022년~2024년
 - 사업비: 5,913백만원(지방소멸대응기금 및 시비)
 - 사업위치: 황지동 428-2 일원
 - 사업규모: 976.94㎡(지상 2층)
 - 주요시설
 - (1층)공공산후조리원: 산모실 10실, 영유아실, 모유수유실, 마사지실, 상담실 등
 - (2층)아이키움센터: 사무실, 프로그램실 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	목표	단위	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	임기후
산모케어센터 신설	1	개소			1			

□ 재원조달 및 투자계획

구분	총 사업비	기투자	연도별 투자액 (단위: 백만 원)					임기이후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,913	-	3,000	2,063	850			
기금	4,000	-	2,400	1,600	-	-	-	-
시비	1,913	-	600	463	850			

연도별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	재원별	임기내						임기후
		계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	
	계	341		341	-	-	-	-
첫생명맞이 &아이키움 센터 건립	기금	222		222	-	-	-	-
	시비	119		119	-	-	-	-

추진실적 및 추진계획

- 태백시 첫생명맞이&아이키움센터 건립계획 수립: 2022. 8. 23.
- 공공건축기획 및 설계용역 계약심사, 설계공모 등: 2023. 4.~9.
- 센터 기본 및 실시설계용역: 2023. 9. ~ 2023. 12.
- 센터 연접 국유지(428-18번지) 매입: 2023. 10.
- B·F예비인증 용역계약 및 추진: 2023. 10.
- 설계 일상감사 및 도 계약심사: 2023. 11.
- 공사 입찰 및 계약추진: 2023. 12.
- 첫생명맞이&아이키움센터 공사 착공: 2024. 1.
- 첫생명맞이&아이키움센터 준공: 2024. 12.

《 연도별 세부실천계획 》

연 도 별	추 진 내 용	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 공유재산 관리계획(안) 제출: 2022. 10월 ▷ 태백시 투자심사 심의서 제출: 10월 ▷ 중지방재정계획 반영: 2022. 12월 ▷ 첫생명맞이&아이키움센터 건축기획용역 착수: 2023. 4월 ▷ 공공건축 사업계획에 대한 사전검토: 2023. 5월 ▷ 공공건축심의위원회 심의: 6월 ▷ 일상감사 및 도 계약심사: 6월 ▷ 첫생명맞이&아이키움센터 실시설계 용역: 9월 ▷ 센터 연접 국유지(428-18번지) 매입: 10월 	
임기내	2023년	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 설계일상감사 및 도 계약심사: 11월 ▷ 설계 안전성 검토용역, 건축 인허가 등: 12월 ▷ 설계용역 준공, 공사 입찰 및 계약: 12월
	2024년	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 센터 건립 공사 착공: 1월 ▷ 센터 운영을 위한 조례 제정: 10월 이전 ▷ 첫생명맞이&아이키움센터 준공: 12월
	2025년~ 2026년	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 센터 민간위탁 공모 등 절차진행: 2025년 상반기 ▷ 첫생명맞이&아이키움센터 개소: 2025년 상반기
임기 이후		


□ 기대효과

- 관내 산모의 원정출산, 산후조리 등에 따른 불편함과 시간적·경제적 부담 해소
- 체계적인 산후 건강관리로 출산 친화적인 도시 환경 조성
- 산후돌봄 사각지대 해소 및 출산율 제고 향상


□ 그 밖에 참고사항(조감도 등)



【 조감도 (안) 】

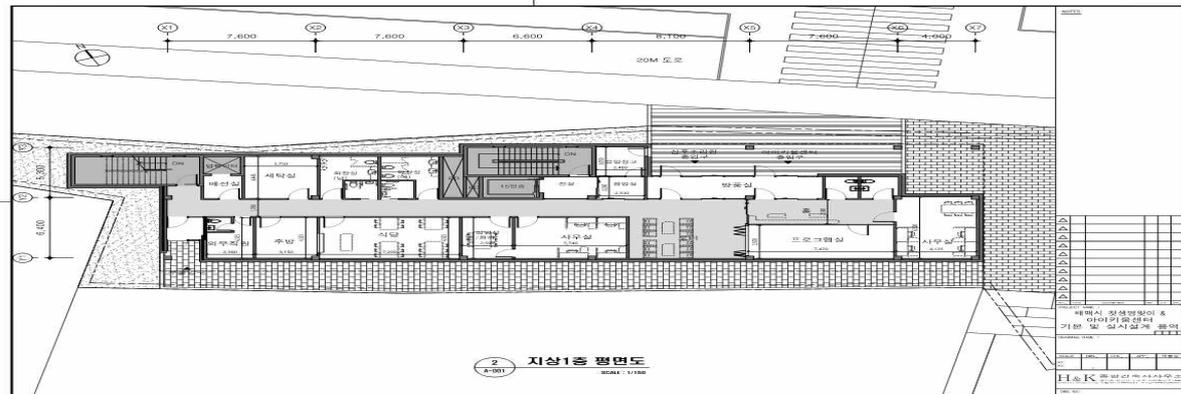

【 1층 평면도 (안) 】

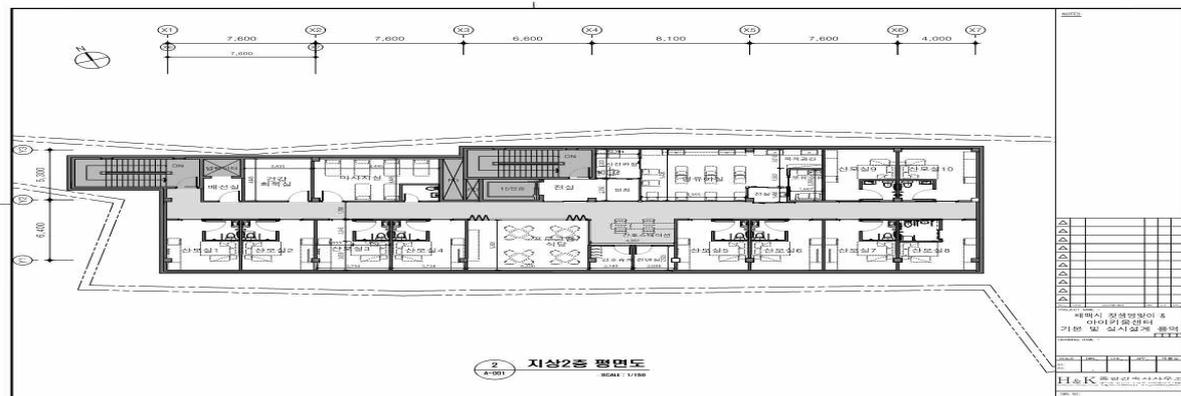

【 2층 평면도 (안) 】

건강과 건강증진팀장 유영옥 (3838) 담당자 김창호 (2194)
