

관리번호	4-7	사계절 365일 이용가능한 다목적 에어돔 설치
------	-----	----------------------------------

사업구분	신규	예산구분	예산	완료시기	2025년
공약구분	임기내	추진진도	정상추진	진도율	20%

비전과 전략

- 사계절 다목적 전지훈련 특화단지 조성을 통한, 전지훈련의 메카 고원레저 스포츠 도시 조성
 - 에어돔 구장, 전지훈련 센터 등 전지훈련 시설 조성을 통한 전지훈련 메카 태백 도시브랜드 구축
 - 기존 스포츠 시설 정비·확충, 스포츠 대회·전지훈련 유치를 통한 전국 유일 스포츠 특구 공고화
 - 국민체육진흥기금, 균형발전특별회계 등 공모사업 신청을 통한 효율적 예산확보 추진

□ 사업개요

- 사업위치: 태백시 문곡동 13-16번지 일원(고원 4구장)
- 사업기간: 2022. 7.~2024. 11.
- 사업예산: 12,500백만원
- 사업내용: 에어돔 구장 및 지원시설 조성
- 면적: 연면적 11,350㎡(에어돔 10,400(축구장 9,000 / 육상트랙 등 1,400(80m×5레인×2개소), 지원시설(샤워실, 전술회의실, 심판대기실 등 950)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	목표	단위	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	임기후
다목적 에어돔 구장 조성	100	%	10	40	100			

□ 재원조달 및 투자계획

구분	총 사업비	기투자	연도별 투자액 (단위: 백만 원)					2026.6월	임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년			
계	12,500	-	-	2,500	10,000		-	-	
국비	-	-	-	-	-		-	-	
도비	6,500	-	-	1,625	4,875		-	-	
시비	6,000	-	-	875	5,125		-	-	

연도별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	재원별	임기내						임기후
		계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	
	계	43	-	43	-	-	-	-
전지훈련 특화시설 (에어돔) 설치	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	28	-	28	-	-	-	-
	시비	15	-	15	-	-	-	-

추진실적 및 추진계획

- 지방재정투자 심사, 중기지방재정계획 반영 공유재산관리계획 승인: 2022. 10.~12.
- 체육진흥시설 지원사업(균특) 사업계획서 제출: 2023. 2.
- 공모신청 및 현장점검: 2023. 2.~4.
- 공모 결과 통보(미선정): 2023. 4. 26.
- 공공체육시설 확충사업(균특) 선정: 2023. 4. 26.
- 건축기획용역 및 부지 지형현황측량용역 착수: 2023. 9.~11.
- 설계공모 및 실시설계용역: 2023. 12.~2024. 6.
- 시설공사 착공 및 준공: 2024. 7.~11.


《 연도별 세부실천계획 》

연 도 별		내 용
임 기 내	'22년	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 공모신청을 위한 기본구상 및 공모 PT 용역 ▷ 에어돔 공모선정 지자체 방문·면담: 경주, 창원 ▷ 전지훈련 특화시설 벤치마킹: 진천 ▷ 사업비 확보를 위한 업무협약: 강원도, 세종 ▷ 강원도 지방재정투자심사 승인 ▷ 공모사업 추진을 위한 방문협약: 국민체육진흥공단 ▷ 중기지방재정계획 반영 및 공유재산관리계획 승인
	'23년	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 전지훈련 특화시설(에어돔) 설치·지원사업 공모신청 ▷ 강원도 체육진흥시설 지원(전환)사업 사업계획 및 지방비 확보 ▷ 건축기획, 설계공모 및 실시설계용역
	'24년	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 설계공모 및 실시설계용역 ▷ 시설공사 착공 ▷ 시설공사 준공

기대효과

- 각종 전지훈련 및 스포츠대회 유치를 통한 지역경제활성화
- 지역 유소년 전지훈련 장소 제공 등 스포츠 진흥 활성화 및 각종 재난 발생 시 재난 대피시설 활용 등 안전과 상생에 기여

□ 그 밖에 참고사항(조감도 등)

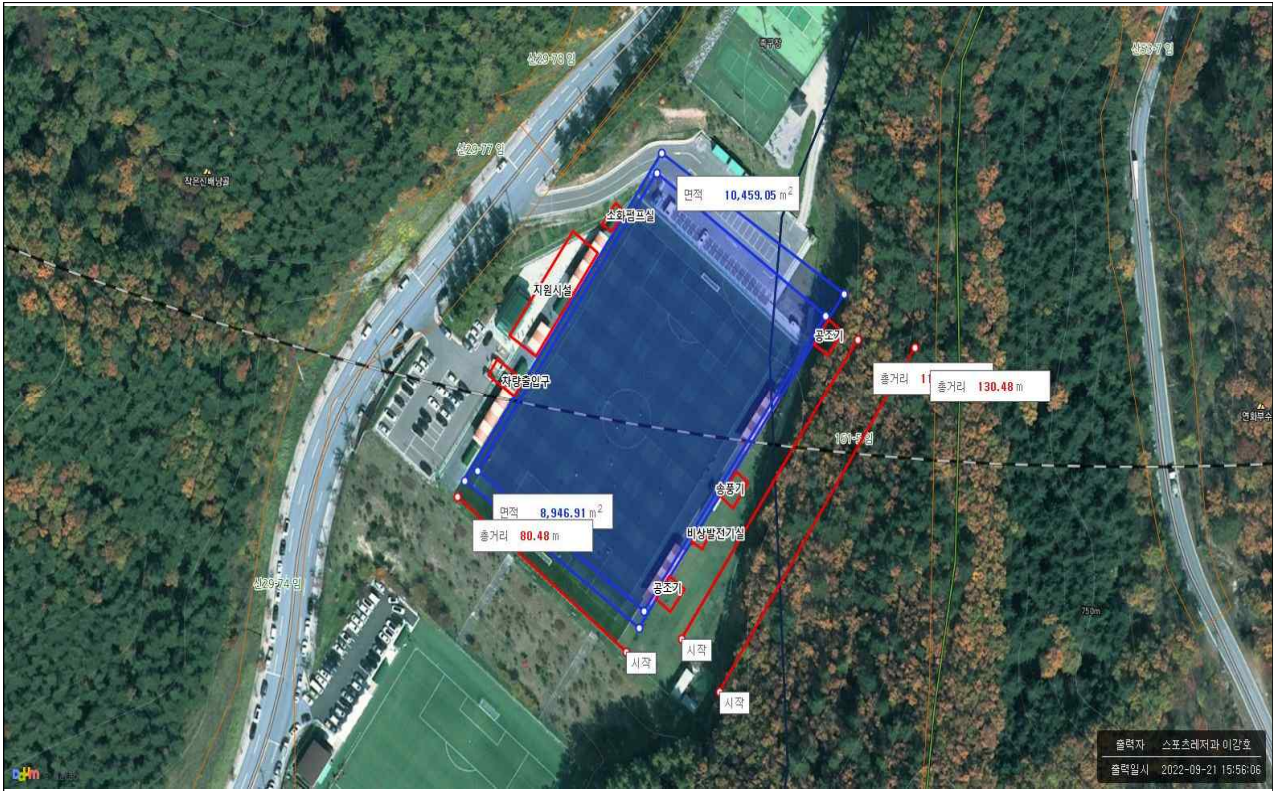

스포츠과 스포츠산업팀장 김승년(3957) 담당자 정보배(3998)
